


Evolution AEP Koréra-Koré village en 2015 & alimentation eau jardin maraîcher Koréra-Koré village

Hier



Nouveau forage NF 2009

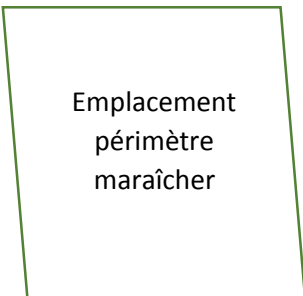

Forage Padec Production insuffisante



X



Forage FP4 PRS En panne

25 m³/jour

25 m³/jour

Réservoir béton fermé 15 m³
+ réservoir débordement env 8 m³

Oued Goudjou-goudjou



Distribution vers village

Evolution AEP Koréra-Koré village en 2015 & alimentation eau jardin maraîcher Koréra-Koré village



Lancement des travaux : 25 mai 2015

AUJOURD'HUI



Formation des responsables




Forage NF 2009 nouvelle pompe



4 bassins de puisage en béton de 5 m³ chacun

Réservoir principal béton 15 m³ et réservoir débordement 8 m³, rénovés

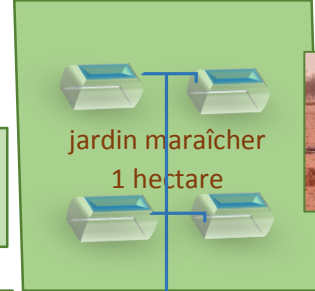

jardin maraîcher 1 hectare



Réalisation de la clôture en grillage et haie vive



Pépinière pour haie



Forage FP4 PRS nouvelle pompe nouveau champ solaire

Oued Goudjou-goudjou

25 m³/jour

50 m³/jour

Travaux terminés (réception provisoire) le 1^{er} août 2015 coût : 36 000 €



Distribution vers village
